



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 18/14-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 323-18/14-04-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)» Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14 - 04 - 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω επείγουσας ανάγκης άμεσης ολοκλήρωσης του έργου του 1ου θέματος, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 32411/46/13-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης   | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη   | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή |               |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός  | Τακτικό Μέλος |

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1ο:** Εισηγήση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)» Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ :** Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»

**Ανάδοχος:** Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.

**ΣΧΕΤ.:** Η με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 5669/1292/21-1-2016 αίτηση για παράταση προθεσμίας της 5<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου, όπως επίσης και για τροποποίηση παλαιότερων αποφάσεων της Οικον. Επιτροπής  
**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:** Ν. Ανδρεάτος, αναπ/τής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

**ΣΧΕΤ.:** α) Η με αρ. ημετ. πρωτ. 5669/1292/21-1-2016 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., για παράταση της 5<sup>ης</sup> αποκλειστικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του Έργου, όπως επίσης και για τροποποίηση παλαιότερων αποφάσεων της Οικον. Επιτροπής (συνημμένο 1)

β) Η με αρ. ημετ. πρωτ. 31517/7352/12-4-2016 συμπληρωματική αίτηση - δήλωση της Αναδόχου Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., περί παραίτησης από τη θετική αναθεώρηση (συνημμένο 2)

γ) Η με αρ. πρωτ. 794/13-4-2016 Διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης του έργου του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (συνημμένο 3)

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:** Ν. Ανδρεάτος, αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜV001606204/5-9-2013)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ ) αρχικά, η οποία αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με τον ΔΙΟΝΥΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ

ΑΔΑ:Ω4Χ87ΛΕ-ΠΑ6)

(Πολ. Μηχ.) (Απόφαση 1777/424/12-01-2016 Τ.Σ.Ε.)

ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ )

- ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.)  
(Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ- ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος)  
(Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)

- **ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ**  
Επιτροπής

**1.** Βάσει της υπ' αρ. **798-34/25-11-2014** Απόφαση Οικονομικής

Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
4 <sup>η</sup> Α.Π.	23-10-2013	31-12-2013	30-11-2013
4 <sup>η</sup> Ε.Π. (Μόνο για εφέδρανα)	12-12-2013	1-8-2014	28-2-2014
5 <sup>η</sup> Ε.Π.	2-3-2014	20-10-2014	
5 <sup>η</sup> Α.Π.	15-6-2014	6-3-2015	10-6-2014
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	3-9-2014	31-3-2015	31-1-2015

Α.Π. = Αποκλειστική Προθεσμία  
Ε.Π. = Ενδεικτική Προθεσμία**2.** Βάσει της υπ' αρ. 282-15/6-5-2015 Απόφαση Οικονομικής  
Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω6Ι97ΛΕ-43Η0029):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 <sup>η</sup> Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	<b>10-6-2015</b> ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	<b>5-7-2015</b> ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

**3.** Βάσει των υπ' αρ. 606-30/1-9-15 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) και 802-39/3-11-15 (ΑΔΑ 7ΑΘΤ7ΛΕ-5ΥΥ) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 <sup>η</sup> Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	<b>11-10-2015</b> ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	<b>5-11-2015</b> ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

4. Βάσει της υπ' αριθμ. 982-48/22-12-15 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7ΔΞΟ7ΛΕ-Κ2Β):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	4 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Η ΕΩΣ
5 <sup>η</sup> Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	6-3-2016	<b>6-3-2016</b> ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤ ΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	<b>31-3-2016</b> ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤ ΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

- **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** **31-3-2016** (Βλ. σχετικές ανωτέρω παρατηρήσεις σχετικά με αναθεώρηση)
- **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**
  1. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 161/2014 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 130453/36092/30-12-2014) Ένσταση κατά της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφασης Τ.Σ.Ε. περί υποβολής ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της 4<sup>ης</sup> Α.Π. και της 4<sup>ης</sup> και 5<sup>ης</sup> Α.Π. του έργου.
  2. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/176/5-3-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην Υπηρεσία 10-3-2015) Αίτηση Θεραπείας κατά της 798-34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεων της Υπηρεσίας.
  3. Με την υπ' αρ. 82249/18649/10-9-15 ειδική πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 η υπηρεσία ζήτησε από τον ανάδοχο να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/δικαιολογητικά για την παράταση ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του έργου, τάσσοντάς του προθεσμία τεσσάρων ημερολογιακών ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσης προθεσμίας η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ' αρ. 86025/19531/23-9-15 απόφαση έκπτωσης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» επί της οποίας υποβλήθηκε (εμπρόθεσμα) ένσταση με το υπ' αρ. 90700/20715/8-10-15 έγγραφο (καθώς και το υπ' αρ. 90470/20662/7-10-15 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του έργου). Με την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. έγινε δεκτή η ένσταση του αναδόχου.

## 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

### 1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25 Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού

γέφυρας, τοίχου πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες:

- Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των πρανών.
- Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην κατάντη (δυτική) πλευρά της οδού, προβλέπεται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος.
- Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, προβλέπεται μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.

#### 1.2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για το έργο έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1<sup>η</sup> Σ.Σ). Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Η διαδικασία έγκρισης και υπογραφής της Σ.Σ. εκκρεμεί (βλ. κατωτέρω κεφάλαιο 1.4).

### 1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, η εκσκαφή ανάντη πρανούς, η τοποθέτηση μέρους των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και των πλεγμάτων επένδυσης πρανών, η κατασκευή των πασσάλων ακρόβαθρων της γέφυρας, η κατασκευή πασσαλότοιχων αντιστήριξης και οι αγκυρώσεις βραχοπροστασίας πάνω από τη στάθμη της οδού. Τέλος έχει ολοκληρωθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 90-95% η κατασκευή της μεταλλικής γέφυρας στο εγκεκριμένο εργοστάσιο βιομηχανοποίησης.

### 1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου **ανέρχεται στο ποσό των 6.698.871,12 €, με Φ.Π.Α.** Μετά την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 απόφαση της Ο.Ε. η υπηρεσία μας κοινοποίησε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον Ανάδοχο, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. **Εκκρεμεί** η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. λόγω χρηματοδότησης. Οι δαπάνες του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	217.625,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	39.172,59
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	23.111,83
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	279.909,94
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	0,00
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	8.707,95
<b>Άθροισμα</b>	<b>5.446.236,68</b>	<b>5.446.236,68</b>	<b>288.617,89</b>
Φ.Π.Α. 23 %	1.252.634,44	1.252.634,44	66.382,11
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>6.698.871,11</b>	<b>6.698.871,11</b>	<b>355.000,00</b>
		<b>7.053.871,11</b>	

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε –σε σχέση με την κύρια σύμβαση- προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες:

#### 1.4.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε προμετρητικά λάθη, στην ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες και για να συμπεριληφθούν εργασίες οι οποίες καιτοι προβλέπονταν από τη μελέτη δεν είχαν τιμολογηθεί.

Στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ εκτός από τις εργασίες της κύριας Σύμβασης περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.).

1.4.2 1<sup>η</sup> Σ.Σ.

Οι εργασίες της 1ης Σ. Σ.:

- α. Δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη ούτε στην αρχική Σύμβαση και  
β. Κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεσή του.

Σημειώνεται ότι για την σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου (με 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.) έχουν γίνει οι κάτωθι ενέργειες από τον Ιούλιο του 2014

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
<b>2014</b>				
1	<b>Ιούλιος-Αύγουστος 2014</b>			ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΕ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2	οικ. 81702/23171/18-8-2015	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Ανάδοχο	Αποστολή 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1 <sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με 1 <sup>η</sup> Σ.Σ.) για υπογραφή από Ανάδοχο
3	ημ. 87096/24258/4-9-2014	Ανάδοχο	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Αποστολή υπογεγραμμένου ΑΠΕ
4	ημ. 87096/24528/4-9-2014	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με 1η Σ.Σ.) για προέγκρισή τους
5	2397/25-9-2015 (ημ. 96413/26951/1-10-2014)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Επιστολή με την οποία ζητούνται στοιχεία - διευκρινίσεις
6	96413/26951/17-10-2014	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή Συμπληρωματικών στοιχείων για 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ, 1 <sup>η</sup> ΣΣ.
7	2810/25-11-2014	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 2810/25-11-2014 έγγραφό της περί Τροποποίησης Σύμβασης.
8	117600/32702/1-12-2015	ΤΣΕ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	Αίτηση για γνωμοδότηση για: 1. τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2. την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και για την ανάλωση «επί έλαττον δαπανών»
9	4-12-2014	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ		Ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας (στο 7 <sup>ο</sup> Πρακτικό/4-12-2014 θέμα 8 <sup>ο</sup> ) και για τα δύο θέματα.
10	οικ. 122525/34219/8-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΟΙΚ. ΕΠ.	Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
11	9-12-2014 (ΑΔΑ ΟΠΛΛ7ΛΕ-ΗΑΒ)	ΟΙΚ. ΕΠ.		845-36 Απόφαση του 36ου Πρακτικού/9-12-2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου
12	οικ. 126215/35293/17-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Ηλεκτρονική υποβολή 1 <sup>ου</sup> Τροποποιημένου ΤΔΕ στο ΟΠΣ και αποστολή σχετικού εγγράφου.
13	οικ. 126064/35251/17-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αποστολή Απόφασης ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. έγκρισης σύναψης της 1ης Σ. Σ. για πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο
<b>2015</b>				
14	123706/48355/5-1-2015 (ημ. 1067/2817-1-2015)	ΟΙΚ. ΕΠ.	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Αποστολή με αλληλογραφία της Απόφασης ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. έγκρισης σύναψης της 1ης Σ. Σ.
15	27736/14116/9-1-2015 (ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 12-1-2015)	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της εγκριτικής υπ' αρ. 845-36/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων. (ΑΔΑ ΩΖΦ3ΟΡ1Φ-ΤΒΧ).
16	οικ. 4715/1037/15-1-2015	ΔΤΕ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	Αποστολή στοιχείων για προσυμβατικό έλεγχο
17	3168/18-2-2015	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΔΤΕ	Αποστολή 33/2015 Πράξης (Αναβλητική)
18	οικ. 18567/4030/18-2-2015	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (33/2015)

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
19	347/2-3-2015	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Επιστολή για εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου
20	Ημ. 22067/4867/3-3-2015 (ΑΔΑ: 76Τ57ΛΕ-4Τ3)		ΔΤΕ	Απόφαση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση <b>(άνευ κοινοποίησης στον ανάδοχο)</b>
21	1840/4000/3-3-2015	ΔΤΕ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	Αποστολή Συμπληρωματικών στοιχείων
22	16522/24-3-2015	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΔΤΕ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (66/2015) – Δεν κωλύεται η υπογραφή 1 <sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης
23	οικ. 29720/6624/26-3-2015	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (66/2015) και επανάληψη αιτήματος για τροποποίηση Πράξης Ένταξης.
24	29646/6617/31-3-2015	ΔΤΕ	(Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό) 1. ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 2. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 3. ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	Κοινοποίηση Πράξεων Ε.Σ. (33 και 66/2015)
25	3379/31-3-2015 (ημ. 31956/7188/1-4-2015)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Σε απάντηση του από 17-12-2014 αιτήματος (βλ. α/α 12) ζητούνται στοιχεία προκειμένου να εξετασθεί η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης
26	31956/7188/8-5-2015	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Επανυποβολή 1ου Τροποποιημένου ΤΔΕ (Βλ. φάκελο Δελτίων).
27	1071/4-6-2015 (ημ. 53529/12360/5-6-2015)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΤΣΕ	Ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία (ο ΑΠΕ με τα συνοδευτικά του έγγραφα, Εγκεκριμένες Μελέτες Υπόεργου 2, Πίνακες, Χρον/μα GANNT που να τεκμηριώνει ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 2015 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
28	53529/12360/11-6-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή των ανωτέρω στοιχείων
29	Οικ. 58464/13562/18-6-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κατόπιν τ/φ επικοινωνίας την ίδια ημέρα απεστάλη οριζ/φία χάραξης μέτρων βραχοπροστασίας με διαχωρισμό Κ.Σ. και 1ης Σ.Σ.
30	Οικ. 68628/15821/22-7-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να ενημερωθούμε εγγράφως για την πρόοδο της πορείας του αιτήματος.
31	1647/30-7-2015 (Ημ. 71361/16411/31-7-15)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΤΣΕ	Απάντηση για τις ενέργειες που έχουν γίνει. Το αίτημα είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.

## 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

### α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)	ΑΔΑ
1 <sup>η</sup> (2 <sup>η</sup> Εργασιών)	30-12-2015	1528.000,00	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 238.530,42 € ΒΚ0Χ7ΛΕ-Α06
2 <sup>η</sup> (1 <sup>η</sup> Εργασιών)	15-12-2014	623.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 135.162,90 € ΩΔΦΠ7ΛΕ-Θ78
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.239.914,23</b>	<b>Συμπ/νου Φ.Π.Α.</b>

Επίσης έχουν εγκριθεί επί πλέον των ανωτέρω, αναλυτικές επιμετρήσεις (4<sup>η</sup> & 5<sup>η</sup>) που αντιστοιχούν σε εκτελεσμένες εργασίες ύψους περίπου 1.350.000 € (χωρίς ΦΠΑ), επομένως συνολικά:

**ποσοστό εκτελεσμένων - πιστοποιημένων εργασιών ~ 55,00% του έργου.**

β. Εκτίμηση κόστους του επιπλέον των πιστοποιημένων εργασιών εκτελεσμένου αντικειμένου στο εργοτάξιο του έργου (Αξία εργασιών με ΓΕ & ΟΕ), από προμετρητικά στοιχεία της επίβλεψης: περίπου 100.000,00 €, ήτοι ~ 2,00 % του έργου.

## 1.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.6.1. Ο ανάδοχος στις 21-1-2016 υπέβαλε αίτημα παράτασης της 5<sup>ης</sup> Α.Π. του έργου έως 31-5-2016 καθώς και αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 30-6-2016 (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 5669/1292/21-1-2016) – βλ. *συνημμένο 1*. Επίσης με την ίδια αίτηση ο ανάδοχος αιτήθηκε την τροποποίηση των αποφάσεων:

- Της 798-34/25-11-2014
  - Της 282-15/06-05-2015
  - Της 982-48/22-12-2015
- λόγω μη υπαιτιότητάς του.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε τις ανωτέρω παρατάσεις και τις τροποποιήσεις των ανωτέρω Αποφάσεων με αιτιολογία τα εξής:

α. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης λόγω της από 28-6-2015 επιβολής τραπεζικών περιορισμών

β. Μη έγκριση της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. που νομιμοποιούν πρόσθετες εργασίες κρίσιμες για την κατασκευή της γέφυρας.

γ. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παθητικών αγκυρίων, λόγω της μη επίλυσης από την Δ/νουσα Υπηρεσία του προβλήματος της υπερσυμβατικής κατανάλωσης ενέματος λόγω ύπαρξης δικτύου εγκοίλων στα ανάντη πρανές.

δ. Προβλήματα και καθυστερήσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

ε. Η μη δυνατή έως και σήμερα, για λόγους που σχετίζονται με τη μη υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., μετακίνηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην αρχική του θέση, επί της δεξιάς οριογραμμής της οδού, στο πόδα του πρανού, ώστε να ελευθερωθεί ο αναγκαίος χώρος που απαιτείται για την λειτουργία των γερανών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση της γέφυρας.

στ. Καθυστερήσεις που οφείλονται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ύψος βροχής, ισχυροί άνεμοι) που επικρατούν στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

1.6.2. Ο ανάδοχος στις 12-04-2016 (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 31517/7352/12-04-2016) υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία στο από 21-01-2016 αίτημά του (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 5669/1292/21-1-2016), περί χορήγησης παράτασης και τροποποίησης των αποφάσεων 798-34/25-11-2014, 282-15/06-05-2015, 606-30/01-09-2015 και 982-48/22-12-2015, με το οποίο δηλώνει ότι «*παραίτεται από την θετική αναθεώρηση που θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών που θα συντελεστούν κατά τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα τροποποιηθούν οι ως άνω αποφάσεις*» .

**Κατόπιν αυτών και  
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**



## **1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

### **1.1 Εμπρόθεσμο αίτησης αναδόχου για παρατάσεις**


Ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παρατάσεων στις 21-1-2016. Η αίτηση αυτή θεωρείται εμπρόθεσμη και ως προς τα δύο αιτήματα παρατάσεων, γιατί:

- Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261 Α'/17-12-2014) η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας συγχρηματοδοτούμενου έργου λήγει ένα μήνα πριν από τη συμβατική λήξη του έργου, άρα η αίτηση έπρεπε να έχει κατατεθεί έως τις 29-2-2016.
- Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 η υποβολή αιτήματος παράτασης της 5<sup>ης</sup> Α.Π. έπρεπε να γίνει πριν τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 6-3-2016.

### **1.2 Αιτιολογίες αναδόχου στο αίτημα παρατάσεων (παρ. 1.6)**

- 1.2.1 Είναι γενικώς διαπιστωμένο ότι μετά την από 28-6-2015 επιβολή τραπεζικών περιορισμών υπάρχουν διάφορα προβλήματα που καθυστερούν τις διατραπεζικές συναλλαγές των εταιρειών. Σημειώνεται όμως ότι οι καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω της επιβολής των περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων, είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση της προηγούμενης εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι κατά τη χορήγηση της 4<sup>ης</sup> παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας και της 5<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας.
- 1.2.2 Στις 23-2-2016 με το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχ. 15499/3660/23-2-2016 έγγραφο, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 13530/3217/16-2-2016 έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, η μεθοδολογία ανέγερσης της μεταλλικής γέφυρας, η οποία τελικά εγκρίθηκε από τη Δ/νουςα Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15499/3660/25-2-2016 έγγραφό της. Κατά την υποβληθείσα και εγκεκριμένη μεθοδολογία, για την ανάρτηση και συναρμολόγηση της γέφυρας στη τελική της θέση απαραίτητη είναι η παρουσία τουλάχιστον δύο (2) γερανών, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και επιμέλεια το ξεφόρτωμα των τεμαχίων των σιδηροδοκών από τις πλατφόρμες, αλλά και η περαιτέρω απαραίτητη ανάρτηση των τεμαχίων των σιδηροδοκών, ώστε να τοποθετηθούν και κοχλιωθούν στην ακριβή τους θέση σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής. Ο ένας από τους δύο απαραίτητους γερανούς (ΓΕΡΑΝΟΣ 2 στο παρακάτω σχήμα) θα τοποθετηθεί εκτός σκάμματος εκσκαφής, εξωτερικά του ακρόβαθρου Α2 (πλευρά γέφυρας προς Άσσο), έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή μετακίνηση των τεμαχίων, όταν αυτά βρίσκονται στο αέρα και τα περιστρέφει ο κύριος γερανός (ΓΕΡΑΝΟΣ 1 στο παρακάτω σχήμα) που θα βρίσκεται εντός του σκάμματος εκσκαφής. Επίσης, θα σταθεροποιεί τα τμήματα των δοκών, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η μεταξύ τους κοχλίωση καθώς και θα εκτελεί μετακινήσεις τεμαχίων εντός εργοταξιακού χώρου για πιο εύκολη τελική ανάρτηση τους. Ένα ενδεικτικό σχέδιο λειτουργίας των γερανών (απόσπασμα από την εγκεκριμένη μεθοδολογία) φαίνεται παρακάτω. Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι απαιτείται η πλήρης ελευθερία του πεδίου προς τα κατάντη, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες περιστροφές των τεμαχίων των σιδηροδοκών. Επομένως, είναι απαραίτητη για την έναρξη της συναρμολόγησης της γέφυρας, η μεταφορά του εναερίου δικτύου ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ στα ανάντη (από τα κατάντη που βρίσκεται σήμερα), στο πόδα του πρανούς, όπως είχε ζητήσει ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/175/3-3-2015 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 22681/4993/4-3-2015) έγγραφό του, ενέργεια που όμως δεν ήταν δυνατόν να γίνει έως και σήμερα, διότι πρέπει προηγουμένως, για λόγους ασφάλειας της εργασίας, να έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη του υπερκείμενου πρανούς όλης της περιοχής με τα απαραίτητα μέτρα βραχοπροστασίας (φράκτες ανάσχεσης και επένδυση πρανών με αγκυρούμενο πλέγμα). Η κάλυψη, όμως, του τμήματος του υπερκείμενου πρανούς που βρίσκεται στα ανάντη της θέσης που πρόκειται να τοποθετηθεί ο δεύτερος (προς Άσσο) γερανός, με το φράκτη ανάσχεσης (διατομές 35-41) όσο και με το αγκυρούμενο πλέγμα κάτω από αυτόν, είναι

εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί στην 1η Σ.Σ.Ε., η οποία έως και σήμερα δεν έχει υπογραφεί για λόγους στους οποίους δεν έχει καμία υπαιτιότητα ο ανάδοχος. Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι για τη μη έναρξη συναρμολόγησης και επομένως και για τη μη ολοκλήρωση της μεταλλικής γέφυρας εντός των χρονικών ορίων της 5ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας δεν έχει υπαιτιότητα ο ανάδοχος, καθότι πρέπει προηγουμένως να υπογραφεί η 1η Σ.Σ.Ε., να ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν (τα μέτρα βραχοπροστασίας στο τελευταίο -προς Άσσο- τμήμα του πρανούς) και να μεταφερθεί στη συνέχεια το εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ στο πόδα του ανάντη πρανούς της οδού, ούτως ώστε να ελευθερωθεί το πεδίο στα κατάντη για την ασφαλή λειτουργία των γερανών και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η ανάρτηση και η τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας.

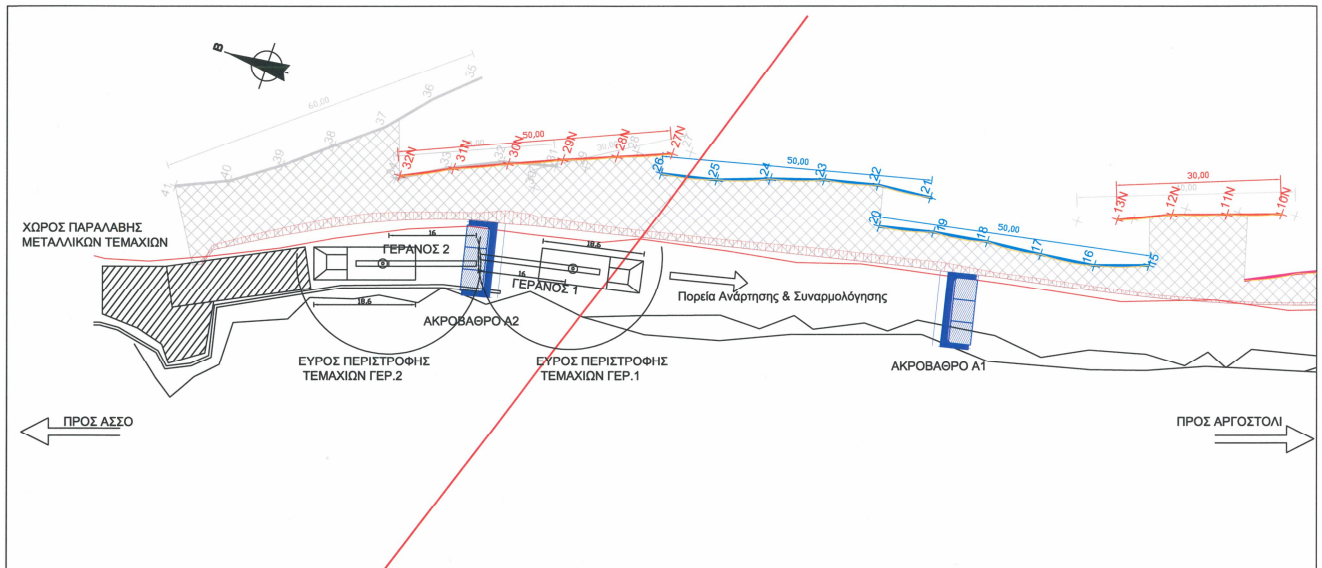

1.2.3 Εφόσον για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν είχε την αποκλειστική υπαιτιότητα για τη μη ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας στην περιοχή της κατάντη εντός της 5<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι δεν είχε την αποκλειστική υπαιτιότητα και για την υπέρβαση της Συνολικής Προθεσμίας.

## 2. Πορεία και πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου

2.1 Από το υπ' αρ. πρωτ. 1647/30-7-2015 έγγραφο και τις προφορικές ενημερώσεις της Υπηρεσίας από την Διαχειριστική Αρχή δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του αιτήματος τροποποίησης της Πράξης του έργου όσο αφορά στη χρηματοδότηση της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.

2.2 Με δεδομένο το γεγονός ότι για τη μεταλλική γέφυρα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η κατασκευή της και βρίσκεται στον εργοστασιακό χώρο της εταιρείας «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.», η υπηρεσία μας πιστεύει ότι στο διάστημα που ακολουθεί θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταφορά και τοποθέτηση της γέφυρας, εφόσον προηγουμένως υπογραφεί η 1<sup>η</sup> Σ.Σ. και ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.

## 3. Σχέδιο Χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος δεν προσκόμισε Σχέδιο χρονοδιαγράμματος με την αίτησή του. Το έργο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διάστημα της παράτασης να ισχύει κατ' αντιστοιχία το 2<sup>ο</sup> αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, με μετάθεση αντίστοιχων ημερομηνιών.

#### 4. Σχετικά με τις προηγούμενες αποφάσεις χορήγησης παρατάσεων

Σχετικά με τις προηγούμενες αποφάσεις παρατάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής:  
Όπως αναφέρεται και στην από 21-01-2016 αίτηση παράτασης του αναδόχου, την οποία αφορά η παρούσα εισήγηση, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις, οι οποίες ενέκριναν τις παρατάσεις που αναφέρονται σε αυτές ήτοι :

Απόφαση 798-34/25-11-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Απόφαση 282-15/06-05-2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Απόφαση 606-30/01-09-2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Απόφαση 982-48/22-12-2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Σε όλες τις πιο πάνω αποφάσεις αναφέρθηκε ότι οι παρατάσεις χορηγούνται για ορισμένα τμήματα αυτών «χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου» και συγκεκριμένα:

Α) Με την 798-34/25-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση:

Για την 4η Αποκλειστική Προθεσμία από 30-11-2013 έως 31-12-2013

Για την 4η Ενδεικτική Προθεσμία από 28-02-2014 έως 01-08-2014

Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 10-06-2014 έως 06-03-2015

Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 31-01-2015 έως 31-03-2015

Β) Με την 282-15/06-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση:

Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 31-03-2015 έως 05-07-2015 για τις συμβατικές εργασίες της Κύριας Σύμβασης

Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 06-03-2015 έως 10-06-2015 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.

Γ) Με την 606-30/01-09-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση:

Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 10-06-2015 έως 11-10-2015 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.

Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 05-07-2015 έως 05-11-2015 για τις συμβατικές εργασίες της Κύριας Σύμβασης

Δ) Με την 982-48/22-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση:

Για την (αντίστοιχη) 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 11-10-2015 έως 06-03-2016 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.

Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 05-11-2015 έως 31-3-2016 για τις συμβατικές εργασίες της Κύριας Σύμβασης

Ενόψει όμως των όσων εκτέθηκαν παραπάνω στην παράγρ. 1.2.2 και συνυπολογιζόμενου του γεγονότος ότι ενώ ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε στις 3-3-2015, κοινοποιήθηκε τελικά στον ανάδοχο στις 16-11-2015, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 103008/23628/16-11-2015 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και με τη ρητή εντολή «να εκτελεστεί μόνο η Κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι οι εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε. για τις οποίες υπάρχει εκκρεμότητα», άρα ο ανάδοχος έως τις 16-11-2015 όπου δεν είχε κοινοποιηθεί ο εγκεκριμένος 1ος Α.Π.Ε. που περιλάμβανε και τη νέα τιμή Ν.Τ. 1/1 για την προσαύξηση της τιμής των φρακτών απορρόφησης ενέργειας 500 KJ λόγω αύξησης του ονομαστικού ύψους από 2,0 m σε 3,0 m, δεν είχε την αποκλειστική υπαιτιότητα για τη μη κατασκευή και τοποθέτηση των εγκεκριμένων φρακτών ISOSTOP 500E, ικανότητας 500 KJ και ύψους 3,0 m., τεκμαίρεται ότι, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η καθυστέρηση εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση δεν οφείλονταν σε «αποκλειστική» υπαιτιότητα του αναδόχου. Έτσι έχουμε την άποψη ότι όλες οι μνημονευθείσες ανωτέρω αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής της

Π.Ι.Ν. πρέπει να τροποποιηθούν ως προς το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σημειώνουμε ότι ο ανάδοχος του έργου αναγνωρίζοντας και αυτός τα απρόοπτα γεγονότα και προβλήματα που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου και θέλοντας να συμβάλει στην οικονομικότερη ολοκλήρωση του έργου, με την από 12-04-2016 Αίτηση-Δήλωση του προς την Υπηρεσία (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 31517/7352/12-04-2016) δήλωσε ρητώς, ότι παραρτείται από την θετική αναθεώρηση που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών που θα τελεστούν κατά τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

5. Την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ. 794/13-4-2016 έγγραφο της Π.Ι.Ν. – Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

## Εισηγούμεθα

1) Την τροποποίηση των ως άνω μνημονευθεισών αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής της Π.Ι.Ν. περί παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών του έργου για τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται ανωτέρω (παράγραφος Α έως Δ), χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, τούτου (του αναδόχου) παραιτούμενου από την θετική αναθεώρηση που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών στις ως άνω χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα εισηγούμεθα :

Α) να τροποποιηθεί η 798-34/25-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 10-06-2014 έως 06-03-2015
- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 31-01-2015 έως 31-03-2015

Β) να τροποποιηθεί η 282-15/06-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 31-03-2015 έως 05-07-2015 για τις συμβατικές εργασίες της Κ.Σ.
- Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 06-03-2015 έως 10-06-2015 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.

Γ) να τροποποιηθεί η 606-30/01-09-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 10-06-2015 έως 11-10-2015 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.
- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 05-07-2015 έως 05-11-2015 για τις συμβατικές εργασίες της Κ.Σ.

Δ) να τροποποιηθεί η 982-48/22-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την (αντίστοιχη) 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 11-10-2015 έως 06-03-2016 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.
- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 05-11-2015 έως 31-3-2016 για τις συμβατικές εργασίες της Κ.Σ.

2) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31-03-2016) έως και 30-06-2016 για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, τούτου (του αναδόχου) παραιτουμένου από την θετική αναθεώρηση που τυχών θα προκύψει από τις εκτελούμενες εργασίες έως το αναφερόμενο χρονικό όριο.

3) Τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της παρελθούσης 5ης Α.Π.) μέχρι 05-06-2016 χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

4) Τη χορήγηση αναθεώρησης στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης, εκτός των εργασιών των μέτρων βραχοπροστασίας (φράκτες ανάσχεσης και επένδυση πρανών με αγκυρούμενο πλέγμα).

5) Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης ΣΣ (εφόσον υπογραφεί) από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας του έργου (31-03-2016) και μέχρι τις 30-06-2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Ο αναπ/της Προϊσ/νος Δ.Τ.Ε.

Νικ. Ανδρέατος  
Πολ. Μηχανικός

**Συνημμένα**

Τα ανωτέρω αναφερόμενα

**Εσωτερική διανομή:**

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Δ. Αλεξανδρόπουλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάος Ανδρέατος και ο υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης και επιβλέπων του έργου, κ. Διονύσης Αλεξανδρόπουλος, οι οποίοι έδωσαν διευκρινίσεις επί της εισηγήσεως.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα: 1) την από 21-01-2016 αίτηση παράτασης του αναδόχου, 2) την από 12-04-2016 Αίτηση-Δήλωση του προς την Υπηρεσία με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από την θετική αναθεώρηση που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών που θα τελεστούν κατά τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και 3) την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ. 794/13-4-2016 (Ορθή Επανάληψη 14-04-2016) έγγραφο της Π.Ι.Ν. – Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και τις διευκρινίσεις των παρισταμένων από την Υπηρεσία

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την τροποποίηση των ως άνω μνημονευθεισών αποφάσεων (ως η εισήγηση) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. περί παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών του έργου για τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται ανωτέρω (παράγραφος Α έως Δ), χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, τούτου (του αναδόχου) παραιτουμένου από την θετική αναθεώρηση που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών στις ως άνω χρονικές περιόδους, ως εξής:

Α) Να τροποποιηθεί η 798-34/25-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 10-06-2014 έως 06-03-2015
- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 31-01-2015 έως 31-03-2015

Β) Να τροποποιηθεί η 282-15/06-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 31-03-2015 έως 05-07-2015 για τις συμβατικές εργασίες της Κ.Σ.
- Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 06-03-2015 έως 10-06-2015 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.

Γ) Να τροποποιηθεί η 606-30/01-09-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 10-06-2015 έως 11-10-2015 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.
- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 05-07-2015 έως 05-11-2015 για τις συμβατικές εργασίες της Κ.Σ.

Δ) Να τροποποιηθεί η 982-48/22-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. και να χορηγηθεί παράταση προθεσμιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου:

- Για την (αντίστοιχη) 5η Αποκλειστική Προθεσμία από 11-10-2015 έως 06-03-2016 για τις συμβατικές εργασίες που αντιστοιχούν στην 5η Α.Π.
- Για την Συνολική Προθεσμία του έργου από 05-11-2015 έως 31-3-2016 για τις συμβατικές εργασίες της Κ.Σ.

Μειοψηφούντος του αναπληρωματικού μέλους κ. Αναστασίου (Τάσου) Σαλβάνου, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι όπως υποστηρίζει θα πρέπει οι ανωτέρω τροποποιήσεις των παραπάνω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, να συζητηθούν στο τέλος Ιουνίου ή σε κάθε περίπτωση εν ευθέτω χρόνω διότι μπαίνουν θέματα υπαιτιοτήτων, τα οποία χρήζουν μιας πιο προσεκτικής και ενδελεχούς αντιμετώπισης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1) Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31-03-2016) έως και 30-06-2016 για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, τούτου (του αναδόχου) παραιτουμένου από την θετική αναθεώρηση που τυχόν θα προκύψει από τις εκτελούμενες εργασίες έως το αναφερόμενο χρονικό όριο.

2) Εγκρίνει τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της παρελθούσης 5ης Α.Π.) μέχρι 05-06-2016 χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3) Εγκρίνει τη χορήγηση αναθεώρησης στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης, εκτός των εργασιών των μέτρων βραχοπροστασίας (φράκτες ανάσχεσης και επένδυση πρτανών με αγκυρούμενο πλέγμα).

4) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης ΣΣ (εφόσον υπογραφεί) από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας του έργου (31-03-2016) και μέχρι τις 30-06-2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους κ. Θεόδωρου Καμπίτση ότι δεν θα ξαναδεχθεί να συζητηθεί το θέμα της παράτασης σε επόμενη συνεδρίαση.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 323-18/14-04-2016**

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**  
**Διονύσιος Μπάστας**  
**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**  
**Θεόδωρος Καμπίτσης**  
**Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος**  
**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**
